


CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - TERMINAL MARÍTIMO DE PASSAGEIROS - RECIFE

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	MESES																	
			Nov/11	Dez/11	Jan/12	Fev/12	Mar/12	Abr/12	Mai/12	Jun/12	Jul/12	Ago/12	Set/12	Out/12	Nov/12	Dez/12	Jan/13	Fev/13	Mar/13	Abr/13
01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	2.106.550,27	10%	6%	6%	7%	6%	6%	6%	6%	7%	7%	7%	7%	7%	6%	0%	0%	2%	0%
			217.445,75	133.394,31	133.394,32	142.770,02	135.786,71	135.786,71	135.786,71	135.786,71	157.670,11	157.672,74	146.669,80	146.663,78	146.663,78	136.106,67			44.958,15	
02	SERVIÇOS PRELIMINARES	754.999,22	27%	11%	11%	1%				9%	28%	9%			22%	1%	1%	0%	1%	0%
			156.112,20	64.969,22	64.969,22	4.654,20				52.438,08	160.833,93	65.222,69			163.928,61	6.838,65	6.310,50		8.721,92	
03	SALA PERNAMBUCO	13.551.670,95	1%	0%	0%	2%	1%	4%	2%	2%	5%	0%	5%	21%	16%	3%	2%	12%	6%	
			121.160,16			283.088,17	141.768,48	460.286,74	292.032,55	248.077,15	658.577,45	65.996,37	712.159,99	2.904.850,04	2.149.190,57	2.356.863,41	367.932,91	322.033,35	1.682.653,61	785.000,00
04	ARMAZEM 7	9.343.634,91				1%	1%	1%	2%	3%	1%	8%	5%	10%	12%	11%	4%	10%	11%	
						113.783,99	78.469,54	126.796,45	181.476,00	360.180,56	117.891,43	788.907,09	434.068,91	909.975,18	1.142.871,01	1.733.652,15	1.044.258,77	353.370,70	947.933,13	1.010.000,00
05	DRENAGEM / ÁGUA PLUVIAL	94.589,97																	1%	
																			94.589,97	
06	ADITIVO 01 - ARMAZÉM 08	561.351,00					99%													
							553.286,87													8.064,13
07	SERVIÇOS EXTRAS - Replanilhamento 01 - Maio/2012	1.662.811,89								38%	3%	4%			7%	23%	9%	27%	4%	0%
										407.362,29	27.307,55	67.510,86			109.883,73	374.858,65	153.228,11	451.880,00	70.780,70	
	TOTAL	28.075.606,21																		
	VALOR MENSAL		494.718,11	198.363,53	198.363,54	544.296,38	909.311,60	722.869,90	609.295,26	1.203.844,79	1.122.280,47	1.145.309,75	1.292.892,70	3.961.489,00	3.712.537,70	4.608.319,53	1.571.730,29	1.127.284,05	2.857.701,61	1.795.000,00
	VALOR ACUMULADO		494.718,11	693.081,64	891.445,18	1.435.741,56	2.345.053,16	3.067.923,06	3.677.218,32	4.881.063,11	6.003.343,58	7.148.653,33	8.441.546,03	12.403.035,03	16.115.572,73	20.723.892,26	22.295.622,55	23.422.906,60	26.280.608,21	28.075.606,21
	% MENSAL		1,76%	0,71%	0,71%	1,94%	3,24%	2,57%	2,17%	4,29%	4,00%	4,08%	4,61%	14,11%	13,22%	16,41%	5,60%	4,02%	10,18%	6,39%
	% ACUMULADO		1,76%	2,47%	3,18%	5,11%	8,35%	10,93%	13,10%	17,39%	21,38%	25,46%	30,07%	44,18%	57,40%	73,81%	79,41%	83,43%	93,61%	100,00%


Paulo Roberto Correia Batista
 Diretor de Projetos e Obras
 Mat. 3939-0
 PORTO DO RECIFE S/A


Gabriela Alves da Silva Alcantara
 CREA 27636 - D/PE
 Engenheira Civil





Concrepoxi Engenharia Ltda.
 Engº Civil Bruno Moraes Ventura
 CREA: 026169-D/PE

Av. João de Barros, nº 903, Boa Vista - Recife/PE. CEP 50.100-020 - Fone: +55 81 3312 0400 Fax: +55 81 3312 0414
 e-mail: concrepoxi@concrepoxi.com.br - www.concrepoxi.com.br

Av. João de Barros, nº 903, Boa Vista - Recife/PE. CEP 50.100-020 - Fone: +55 81 3312 0400 Fax: +55 81 3312 0414
 e-mail: concrepoxi@concrepoxi.com.br - www.concrepoxi.com.br

Id	Nome da tarefa	Duração	Início	Término	Predecessoras	28/Jan/13							04/Fe					
						S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T		
1	2ª Etapa Terminal Marítimo de Passageiros	45 dias	Seg 28/01/13	Sex 29/03/13														
2	Obra Civil	45 dias	Seg 28/01/13	Sex 29/03/13														
3	Sala Pernambuco	45 dias	Seg 28/01/13	Sex 29/03/13														
4	Revestimentos internos e externos	45 dias	Seg 28/01/13	Sex 29/03/13														
5	Parede	43 dias	Seg 28/01/13	Qua 27/03/13														
6	Executar revestimento com granit	30 dias	Seg 28/01/13	Sex 08/03/13														
7	Executar revestimento em brenna	15 dias	Qui 07/03/13	Qua 27/03/13	49													
8	Piso	30 dias	Seg 28/01/13	Sex 08/03/13														
9	Executar revestimento com granit	30 dias	Seg 28/01/13	Sex 08/03/13														
10	Teto	40 dias	Seg 28/01/13	Sex 22/03/13														
11	Executar forro	40 dias	Seg 28/01/13	Sex 22/03/13														
12	Pintura	5 dias	Seg 25/03/13	Sex 29/03/13	11													
13	Executar pintura acrílica	5 dias	Seg 25/03/13	Sex 29/03/13	11													
14	Revestimentos internos e externos cor	0 dias	Seg 28/01/13	Seg 28/01/13														
15	Esquadrias	40 dias	Seg 28/01/13	Sex 22/03/13														
16	Instalar esquadrias de alumínio	30 dias	Seg 28/01/13	Sex 08/03/13														
17	Instalar portas de madeira	18 dias	Qua 27/02/13	Sex 22/03/13	20													
18	Instalar portas de vidro temperado	20 dias	Seg 28/01/13	Sex 22/02/13														
19	Instalações Hidrossanitárias	45 dias	Seg 28/01/13	Sex 29/03/13														
20	Fornecer e Instalar balcões e divisórias	22 dias	Seg 28/01/13	Ter 26/02/13														
21	Fornecer e instalar aparelhos e metais	5 dias	Seg 25/03/13	Sex 29/03/13	17													
22	Fornecer e instalar espelhos	5 dias	Seg 25/03/13	Sex 29/03/13	17													
23	Instalações Elétricas	40 dias	Seg 28/01/13	Sex 22/03/13														
24	Instalar pontos elétricos / Acabamento	22 dias	Seg 28/01/13	Ter 26/02/13														
25	Executar quadros de distribuição/gerai	11 dias	Qua 27/02/13	Qua 13/03/13	24													

Projeto: TMP.MPP
 Data: Ter 19/03/13

Tarefa  Etapa  Tarefas externas 
 Divisão  Resumo  Etapa externa 
 Andamento  Resumo do projeto  Prazo final 

Gabriela Alves da Silva Alcantara
 Gabriela Alves da Silva Alcantara
 CREA 27636 - D/PE
 Engenheira Civil

Bruno Moraes Ventura
 Concrepoxi Engenharia Ltda.
 Engº Civil Bruno Moraes Ventura

Paulo Roberto Correia Batista
 Paulo Roberto Correia Batista
 Diretor de Projetos e Obras
 Mat. 3939-0
 PORTO DO RECIFE S/A



Av. João de Barros, nº 903, Boa Vista - Recife/PE. CEP 50.100-020 - Fone: +55 81 3312 0400 Fax: +55 81 3312 0414
 e-mail: concrepoxi@concrepoxi.com.br - www.concrepoxi.com.br

Id	Nome da tarefa	Duração	Início	Término	Predecessoras	28/Jan/13							04/Fe				
						S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	
26	Fornecer e instalar luminárias	8 dias	Qua 13/03/13	Sex 22/03/13	11TT												
27	Instalações Telefônicas	30 dias	Seg 28/01/13	Sex 08/03/13													
28	Fornecer e instalar equipamentos (rack)	8 dias	Qua 27/02/13	Sex 08/03/13	29,30												
29	Instalar pontos elétricos	22 dias	Seg 28/01/13	Ter 26/02/13													
30	Instalar cabos utp	22 dias	Seg 28/01/13	Ter 26/02/13													
31	Instalações de Prevenção e Combate a Li	40 dias	Seg 28/01/13	Sex 22/03/13													
32	Fornecer e instalar detectores/alarmes	8 dias	Qua 13/03/13	Sex 22/03/13	11TT												
33	Fornecer e instalar luminárias de emer	8 dias	Qua 13/03/13	Sex 22/03/13	11TT												
34	Fornecer e instalar hidrantes, manôme	22 dias	Seg 28/01/13	Ter 26/02/13													
35	Fornecer e instalar extintores portáteis	1 dia	Seg 28/01/13	Seg 28/01/13													
36	Climatização	45 dias	Seg 28/01/13	Sex 29/03/13													
37	Fornecer e instalar condensador e eva	45 dias	Seg 28/01/13	Sex 29/03/13													
38	Coberta	37 dias	Seg 28/01/13	Ter 19/03/13													
39	Executar impermeabilização com mani	22 dias	Seg 28/01/13	Ter 26/02/13													
40	Fornecer e instalar rufos	15 dias	Qua 27/02/13	Ter 19/03/13	39												
41	Executar Instalações de SPDA [pararr	10 dias	Qua 27/02/13	Ter 12/03/13	39												
42	Fachadas	45 dias	Seg 28/01/13	Sex 29/03/13													
43	Cortina mural	45 dias	Seg 28/01/13	Sex 29/03/13													
44	Executar Estrutura de fixação	45 dias	Seg 28/01/13	Sex 29/03/13													
45	Fixação de tela expandida	30 dias	Seg 18/02/13	Sex 29/03/13	44TT												
46	Serviços Complementares e Equipament	45 dias	Seg 28/01/13	Sex 29/03/13													
47	Fornecer e instalar guarda-corpo	45 dias	Seg 28/01/13	Sex 29/03/13													
48	Fornecer e instalar corrimão	45 dias	Seg 28/01/13	Sex 29/03/13													
49	Fornecer e instalar elevadores (2 und.)	22 dias	Ter 05/02/13	Qua 06/03/13													
50	Fornecer e instalar scanners (2 und.)	5 dias	Seg 25/03/13	Sex 29/03/13													

Projeto: TMP.MPP
 Data: Ter 19/03/13

Tarefa

Etapa

Tarefas externas

Divisão

Resumo

Etapa externa

Andamento

Resumo do projeto

Prazo final

Página 2

Gabriela Alves da Silva Alcantara
 Gabriela Alves da Silva Alcantara
 CREA 27636 - D/PE
 Engenheira Civil

Bruno Moraes Ventura
 Concrepoxi Engenharia Ltda.
 Engº Civil Bruno Moraes Ventura
 CREA: 026169-D/PE

Paulo Roberto Correia Batista
 Paulo Roberto Correia Batista
 Diretor de Projetos e Obras
 Mat. 3939-0
 PORTO DO RECIFE S/A

Concrepoxi
 CPX 30
 ANOS

Av. João de Barros, nº 903, Boa Vista - Recife/PE. CEP 50.100-020 - Fone: +55 81 3312 0400 Fax: +55 81 3312 0414
 e-mail: concrepoxi@concrepoxi.com.br - www.concrepoxi.com.br

Id	Nome da tarefa	Duração	Início	Término	Predecessoras	28/Jan/13							04/Fe				
						S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	
51	Armazém 7	45 dias	Seg 28/01/13	Sex 29/03/13													
52	Revestimentos internos e externos	45 dias	Seg 28/01/13	Sex 29/03/13													
53	Parede	43 dias	Seg 28/01/13	Qua 27/03/13													
54	Executar revestimento com granit	30 dias	Seg 28/01/13	Sex 08/03/13													
55	Executar revestimento com brenn	15 dias	Qui 07/03/13	Qua 27/03/13	104												
56	Piso	45 dias	Seg 28/01/13	Sex 29/03/13													
57	Executar revestimento com granit	45 dias	Seg 28/01/13	Sex 29/03/13													
58	Teto	40 dias	Seg 28/01/13	Sex 22/03/13													
59	Executar forro	40 dias	Seg 28/01/13	Sex 22/03/13													
60	Pintura	5 dias	Seg 25/03/13	Sex 29/03/13													
61	Executar pintura acrílica	5 dias	Seg 25/03/13	Sex 29/03/13	59												
62	Esquadrias	40 dias	Seg 28/01/13	Sex 22/03/13													
63	Instalar esquadrias de alumínio	30 dias	Seg 28/01/13	Sex 08/03/13													
64	Instalar portas de vidro temperado	22 dias	Seg 28/01/13	Ter 26/02/13													
65	Instalar portas de madeira	18 dias	Qua 27/02/13	Sex 22/03/13	67												
66	Instalações Hidrossanitárias	45 dias	Seg 28/01/13	Sex 29/03/13													
67	Fornecer e Instalar balcões de granito	22 dias	Seg 28/01/13	Ter 26/02/13													
68	Fornecer e instalar aparelhos e metais	5 dias	Seg 25/03/13	Sex 29/03/13	65												
69	Fornecer e instalar espelhos	5 dias	Seg 25/03/13	Sex 29/03/13	65												
70	Instalações Elétricas	40 dias	Seg 28/01/13	Sex 22/03/13													
71	Instalar pontos elétricos/ acabamentos	27 dias	Seg 28/01/13	Ter 05/03/13													
72	Executar quadros de distribuição/gerai	11 dias	Qua 06/03/13	Qua 20/03/13	71												
73	Fornecer e instalar de luminárias	8 dias	Qua 13/03/13	Sex 22/03/13	59TT												
74	Instalações Telefônicas	22 dias	Seg 28/01/13	Ter 26/02/13													
75	Instalar pontos elétricos	22 dias	Seg 28/01/13	Ter 26/02/13													

Projeto: TMP.MPP Data: Ter 19/03/13	Tarefa		Etapa		Tarefas externas	
	Divisão		Resumo		Etapa externa	
	Andamento		Resumo do projeto		Prazo final	

Gabriela Alves da Silva Alcantara
 Gabriela Alves da Silva Alcantara
 CREA 27636 - DIPE
 Engenheira Civil


Bruno Moraes Ventura
 Concrepoxi Engenharia Ltda.
 Engº Civil Bruno Moraes Ventura
 CREA: 026720745

Paulo Roberto Correia Batista
 Paulo Roberto Correia Batista
 Diretor de Projetos e Obras
 Mat. 3939-0
 PORTO DO RECIFE S/A



Id	Nome da tarefa	Duração	Início	Término	Predecessoras	28/Jan/13							04/Fe					
						S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T		
76	Instalar cabos utp	22 dias	Seg 28/01/13	Ter 26/02/13														
77	Instalações de Prevenção e Combate a I	40 dias	Seg 28/01/13	Sex 22/03/13														
78	Fornecer e instalar luminárias de emer	8 dias	Qua 13/03/13	Sex 22/03/13	59TT													
79	Fornecer e instalar detectores/alarmes	8 dias	Qua 13/03/13	Sex 22/03/13	59TT													
80	Fornecer e instalar hidrantes, manôme	22 dias	Seg 28/01/13	Ter 26/02/13														
81	Fornecer e instalar extintores portáteis	1 dia	Seg 28/01/13	Seg 28/01/13														
82	Climatização	45 dias	Seg 28/01/13	Sex 29/03/13														
83	Fornecer e instalar condensador e eva	45 dias	Seg 28/01/13	Sex 29/03/13														
84	Coberta	44 dias	Seg 28/01/13	Qui 28/03/13														
85	Calafetação das telhas	22 dias	Seg 28/01/13	Ter 26/02/13														
86	Pintura das telhas	22 dias	Qua 27/02/13	Qui 28/03/13	85													
87	Passarela no 2º piso	45 dias	Seg 28/01/13	Sex 29/03/13														
88	Pintura da fachada	10 dias	Seg 28/01/13	Sex 08/02/13														
89	Executar fechamento com alumínio	35 dias	Seg 11/02/13	Sex 29/03/13	88													
90	Área de Serviço (subestação e estadia/v	42 dias	Seg 28/01/13	Ter 26/03/13														
91	Executar alvenarias internas	5 dias	Seg 28/01/13	Sex 01/02/13														
92	Revestimentos internos e externos	15 dias	Seg 04/02/13	Sex 22/02/13	91													
93	Executar Esquadrias	5 dias	Seg 25/02/13	Sex 01/03/13	92													
94	Executar Impermeabilizações	5 dias	Seg 04/02/13	Sex 08/02/13	91													
95	Executar Instalações Elétricas	15 dias	Seg 25/02/13	Sex 15/03/13	92													
96	Executar e instalar subestação elétrica	22 dias	Seg 25/02/13	Ter 26/03/13	92													
97	Executar pintura	5 dias	Seg 25/02/13	Sex 01/03/13	92													
98	Fachadas	40 dias	Seg 28/01/13	Sex 22/03/13														
99	Reboco	10 dias	Seg 28/01/13	Sex 08/02/13														
100	Executar pintura	30 dias	Seg 11/02/13	Sex 22/03/13	99													

Projeto: TMP.MPP
 Data: Ter 19/03/13

Tarefa  Etapa 
 Divisão  Resumo 
 Andamento  Resumo do projeto 

Tarefas externas 
 Etapa externa 
 Prazo final 

Gabriela Alves da Silva Alcantara
 Gabriela Alves da Silva Alcantara
 CREA 27636 - D/PE
 Engenheira Civil

Bruno Moraes Ventura
 Concrepoxi Engenharia Ltda.
 Engº Civil Bruno Moraes Ventura
 CREA: 026169-D/PE

Paulo Roberto Correia Batista
 Paulo Roberto Correia Batista
 Diretor de Projetos e Obras
 Mat. 3939-0
 PORTO DO RECIFE S/A

Id	Nome da tarefa	Duração	Início	Término	Predecessoras	28/Jan/13							04/Fe				
						S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	
101	Serviços Complementares e Equipament	45 dias	Seg 28/01/13	Sex 29/03/13													
102	Fornecer e instalar guarda-corpo	45 dias	Seg 28/01/13	Sex 29/03/13													
103	Fornecer e instalar corrimão	45 dias	Seg 28/01/13	Sex 29/03/13													
104	Fornecer e instalar elevadores (2 und.)	22 dias	Ter 05/02/13	Qua 06/03/13													
105	Fornecer e instalar escada rolante	22 dias	Seg 28/01/13	Ter 26/02/13													
106	Armazém 7 concluído	0 dias	Seg 28/01/13	Seg 28/01/13													
107	Área Externa	44 dias	Seg 28/01/13	Qui 28/03/13													
108	Estacionamento/Urbanização	44 dias	Seg 28/01/13	Qui 28/03/13													
109	Executar pavimentação em blocos de c	44 dias	Seg 28/01/13	Qui 28/03/13													
110	Executar passeios (calçadas)	22 dias	Seg 28/01/13	Ter 26/02/13													
111	Fornecer e instalar eletrodutos e cabea	24 dias	Seg 28/01/13	Qui 28/02/13													
112	Fornecer e instalar postes de iluminaçã	10 dias	Sex 01/03/13	Qui 14/03/13	111												
113	Remover gradil externo da R. Alfredo L	3 dias	Ter 26/03/13	Qui 28/03/13	114TT												
114	Executar paisagismo	22 dias	Qua 27/02/13	Qui 28/03/13	110												
115	Drenagem	30 dias	Seg 28/01/13	Sex 08/03/13													
116	Assentar tubulações em concreto	30 dias	Seg 28/01/13	Sex 08/03/13													
117	Executar caixas coletoras e "boca de l	30 dias	Seg 28/01/13	Sex 08/03/13													

Projeto: TMP.MPP
 Data: Ter 19/03/13

Tarefa 
 Divisão 
 Andamento 


Etapa 
 Resumo 
 Resumo do projeto 

Tarefas externas 
 Etapa externa 
 Prazo final 

Gabriela Alves da Silva Alcantara
 Gabriela Alves da Silva Alcantara
 CREA 27636 - D/PE
 Engenheira Civil

Bruno Moraes Ventura
 Concrepoxi Engenharia Ltda.
 Engº Civil Bruno Moraes Ventura
 CREA: 026169-D/PE

Paulo Roberto Correia Batista
 Paulo Roberto Correia Batista
 Diretor de Projetos e Obras
 Mat. 3939-0
 PORTO DO RECIFE S/A

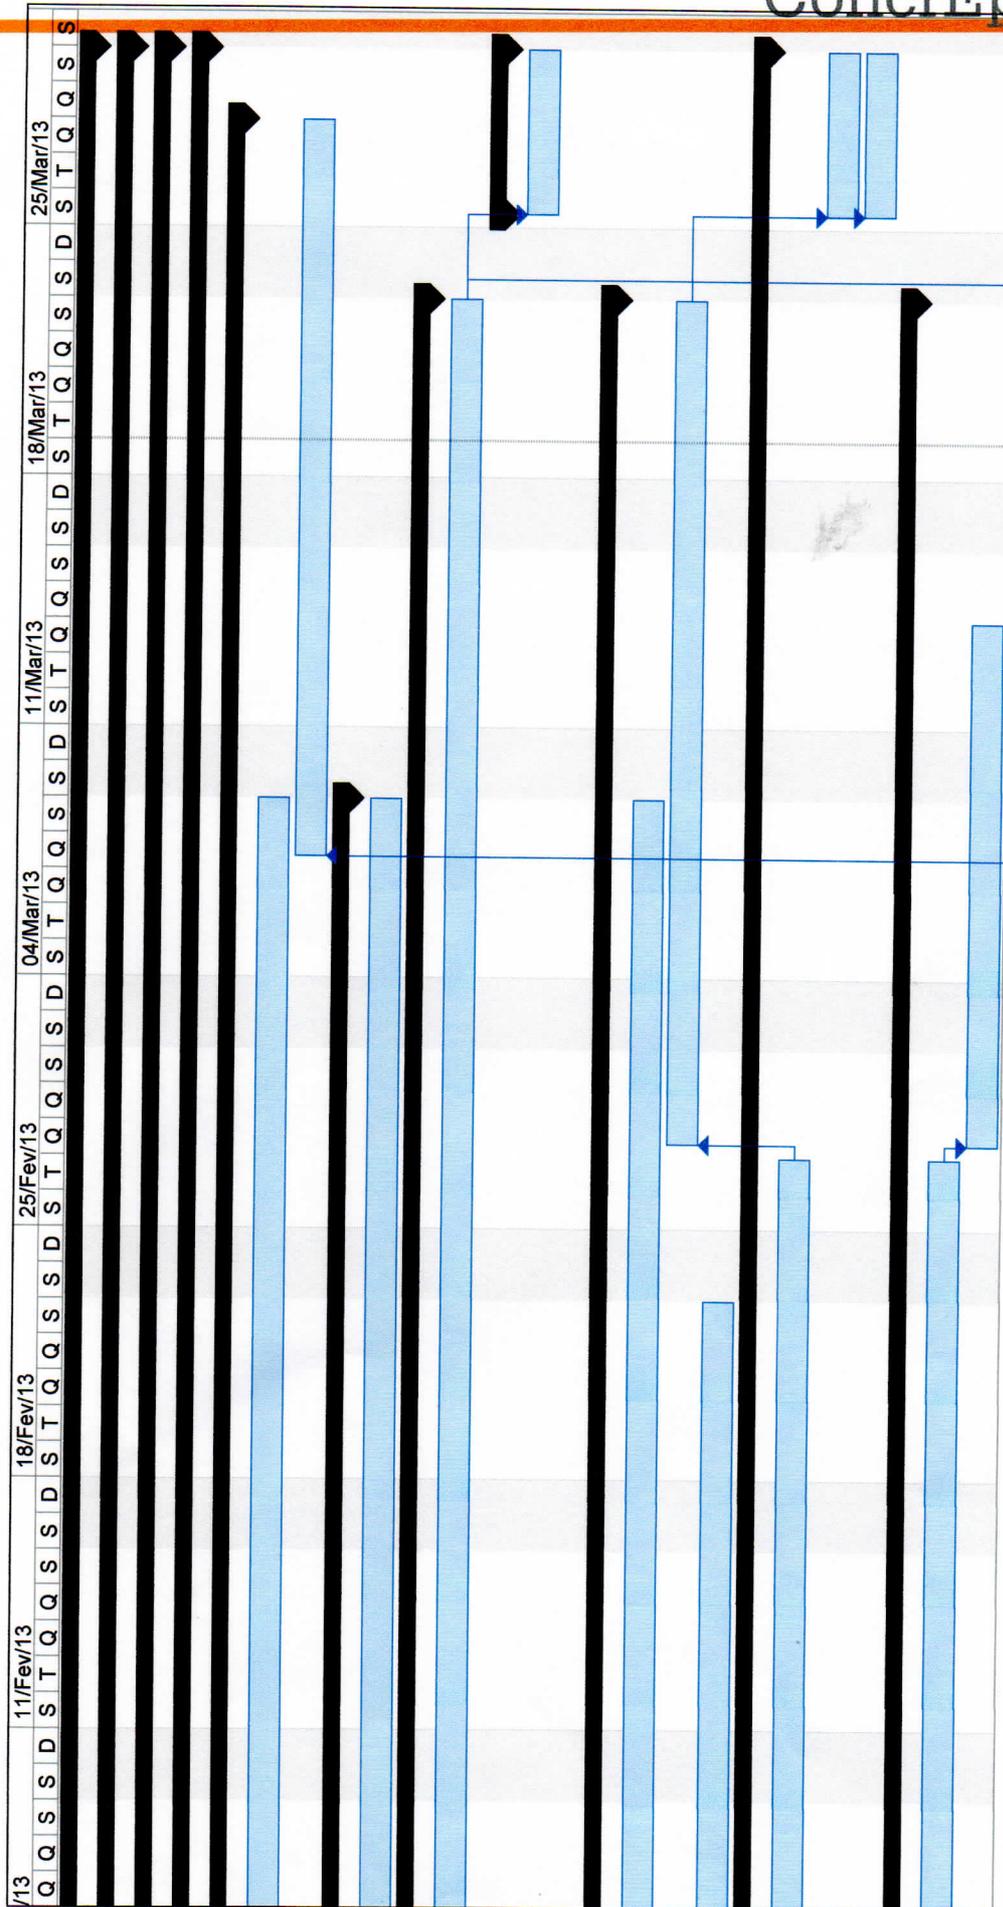

Projeto: TMP.MPP
Data: Ter 19/03/13


Tarefa	Etapa	Tarefas externas
Divisão	Resumo	Etapa externa
Andamento	Resumo do projeto	Prazo final

Página 6

Gabriela Alves da Silva
 Gabriela Alves da Silva Alcantara
 CREA 27636 - D/PE
 Engenheira Civil

Paulo Roberto Correia Batista
 Paulo Roberto Correia Batista
 Diretor de Projetos e Obras
 Mat. 3939-0
 PORTO DO RECIFE S/A

Av. João de Barros, nº 903, Boa Vista - Recife/PE. CEP 50.100-020 - Fone: +55 81 3312 0400 Fax: +55 81 3312 0414
 e-mail: concrepoxi@concrepoxi.com.br - www.concrepoxi.com.br

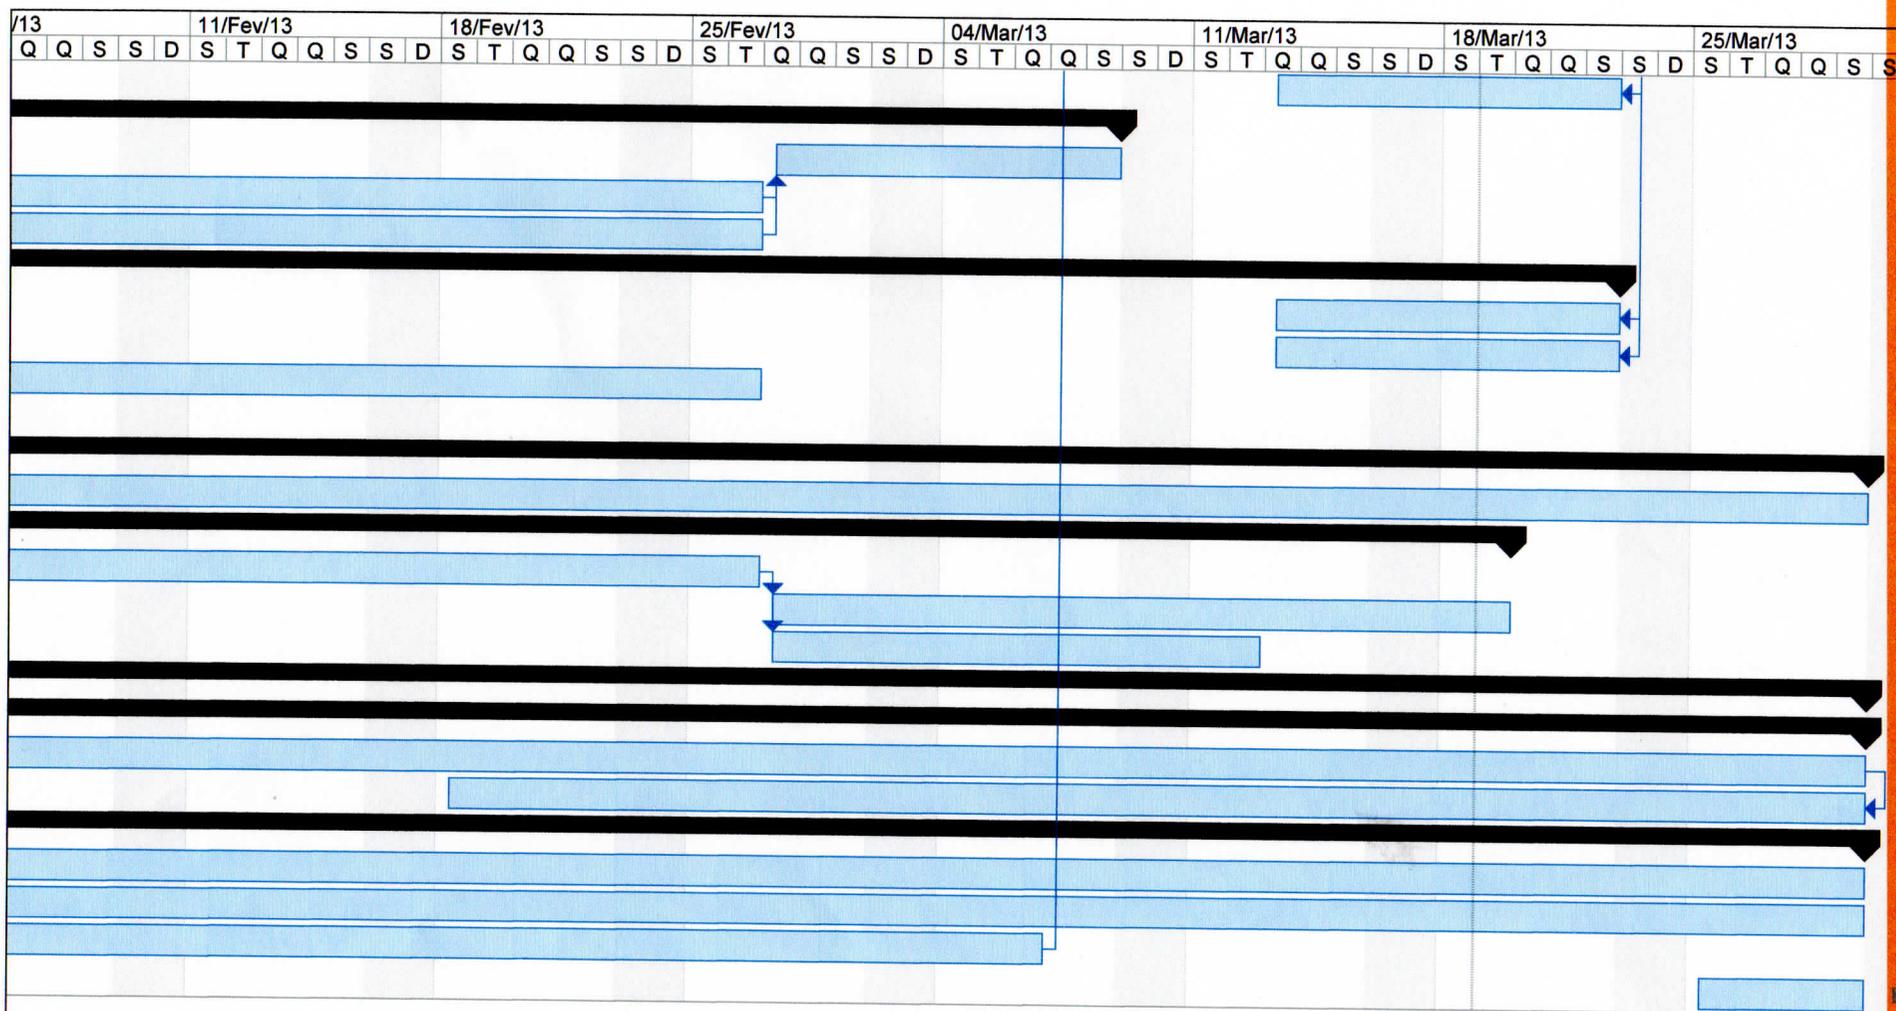


Projeto: TMP.MPP Data: Ter 19/03/13	Tarefa		Etapa		Tarefas externas	
	Divisão		Resumo		Etapa externa	
	Andamento		Resumo do projeto		Prazo final	

Gabriela Alves da Silva Alcantara
 Gabriela Alves da Silva Alcantara
 CREA 27636 - D/PE
 Engenheira Civil

Bruno Moraes Ventura
 Concrepoxi Engenharia Ltda.
 Engº Civil Bruno Moraes Ventura
 CREA: 026169-D/PE

Paulo Roberto Correia Batista
 Paulo Roberto Correia Batista
 Diretor de Projetos e Obras
 Mat. 3939-0
 PORTO DO RECIFE S/A




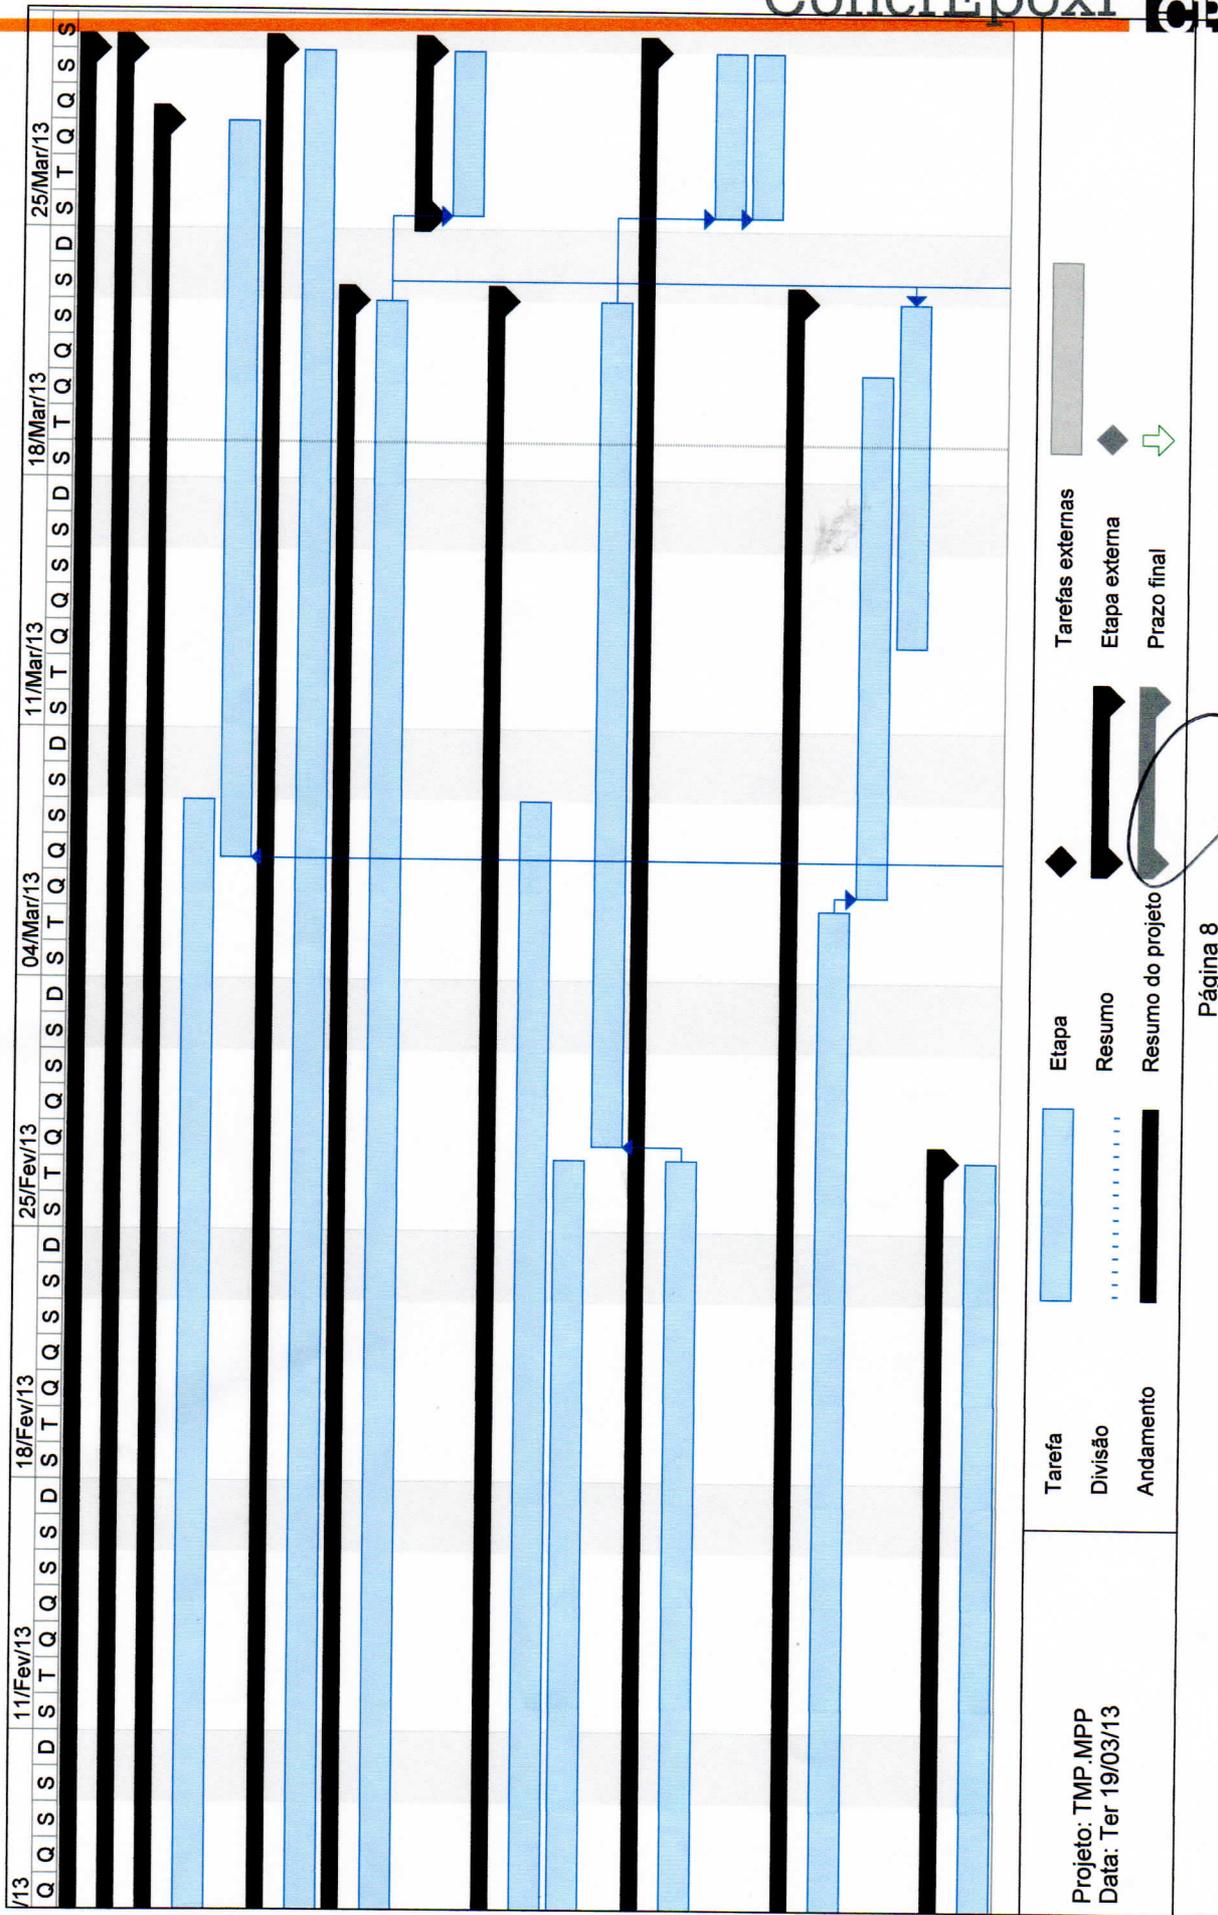

Gabriela Alves da Silva Alcantara
 Gabriela Alves da Silva Alcantara
 CREA 27636 - DIPE
 Engenheira Civil

Paulo Roberto Correia Batista
 Paulo Roberto Correia Batista
 Diretor de Projetos e Obras
 Mat. 3939-0
 PORTO DO RECIFE S/A

Concrepoxi Engenharia Ltda.
 Concrepoxi Engenharia Ltda.
 Engº Civil Bruno Moraes Ventura
 CREA: 026169-D/PE

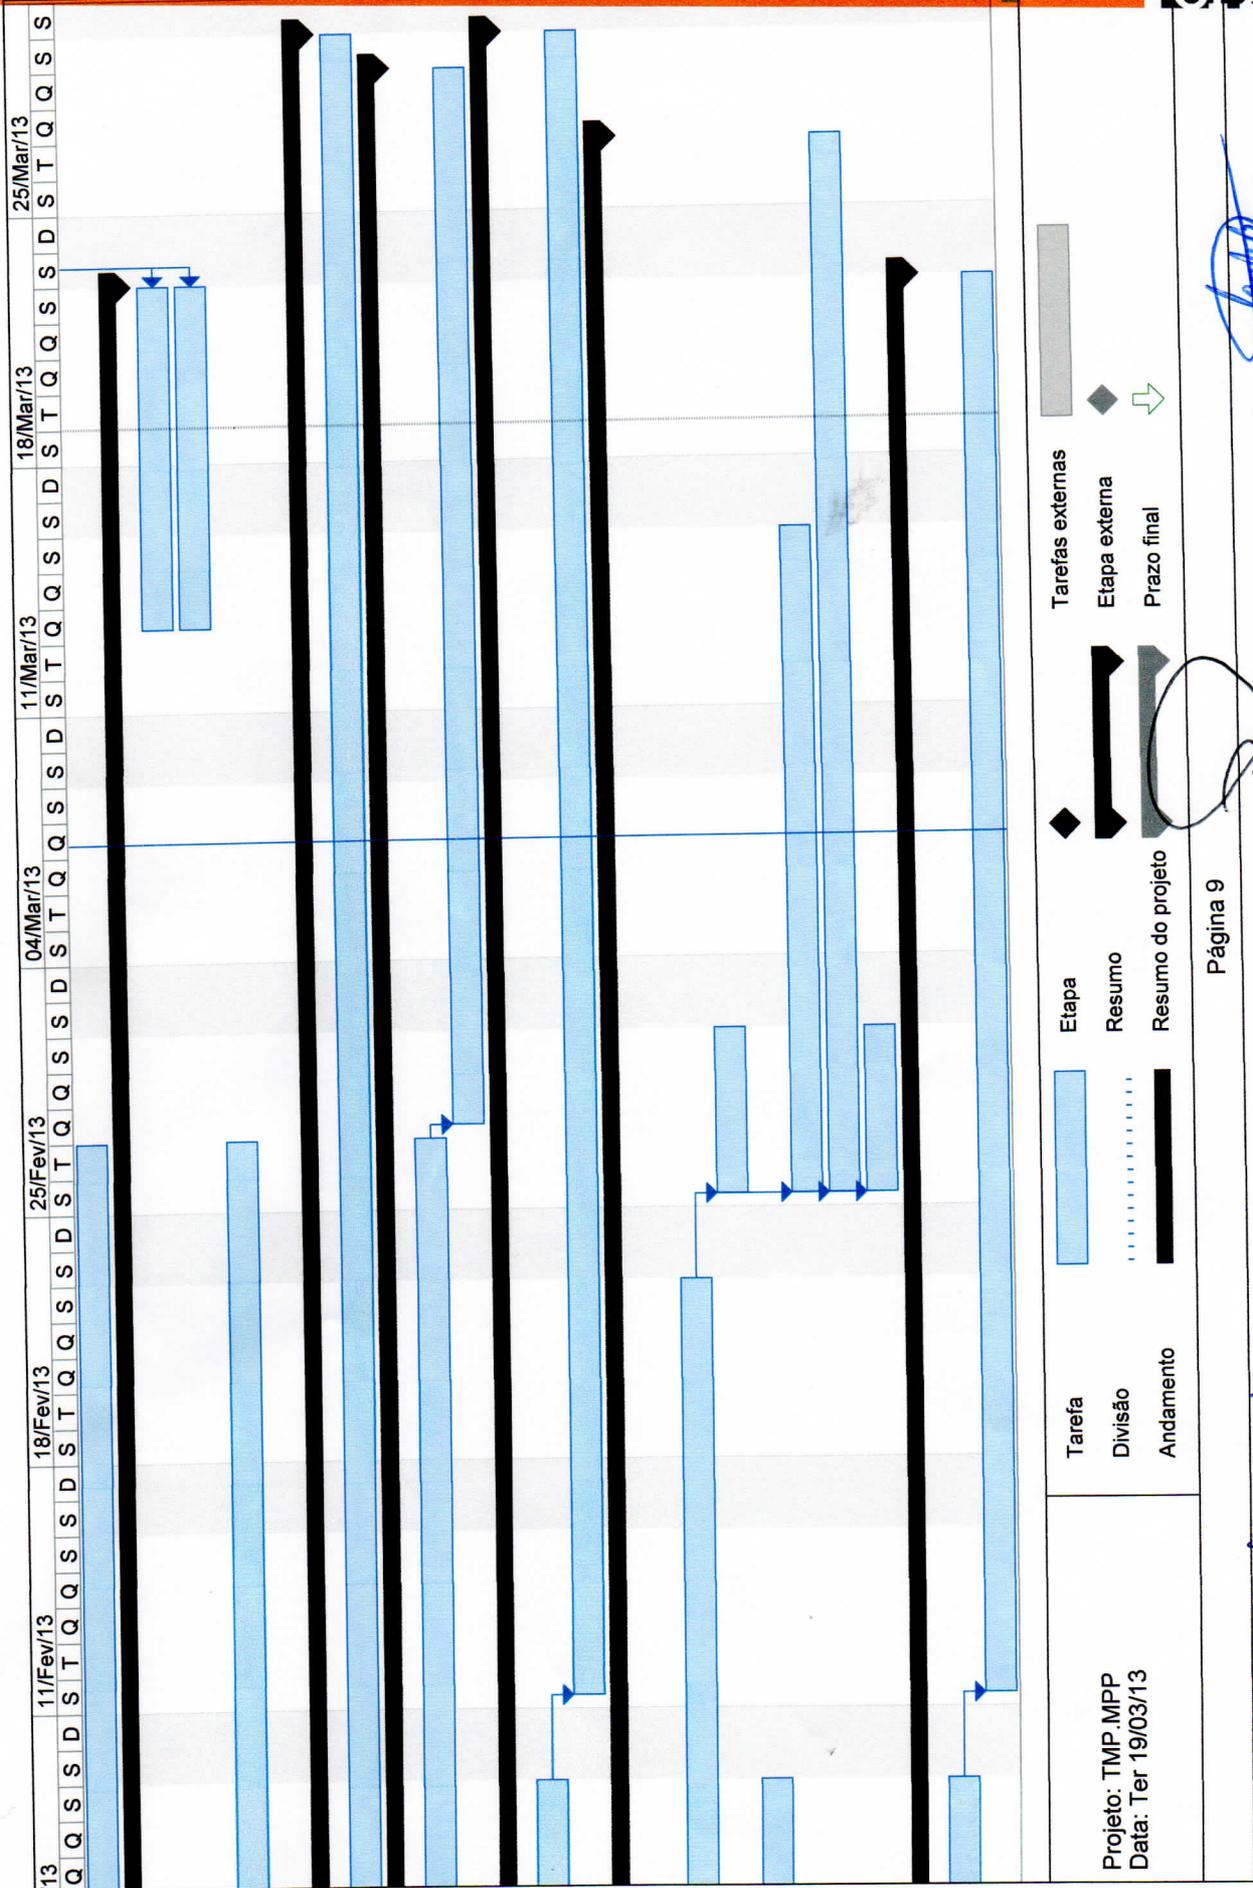


Paulo Roberto Correia Batista
Paulo Roberto Correia Batista
 Diretor de Projetos e Obras
 Mat. 3939-0
 PORTO DO RECIFE S/A

Engº Civil Bruno Moraes Ventura
Concrepoxi Engenharia Ltda.
 Engº Civil Bruno Moraes Ventura
 CREA: 026169-D/PE

Gabriela Alves da Silva Alcantara
Gabriela Alves da Silva Alcantara
 Engenheira Civil
 CREA 27636 - D/PE

Gabriela Alves da Silva Alcantara
Gabriela Alves da Silva Alcantara
 Engenheira Civil
 CREA 27636 - D/PE

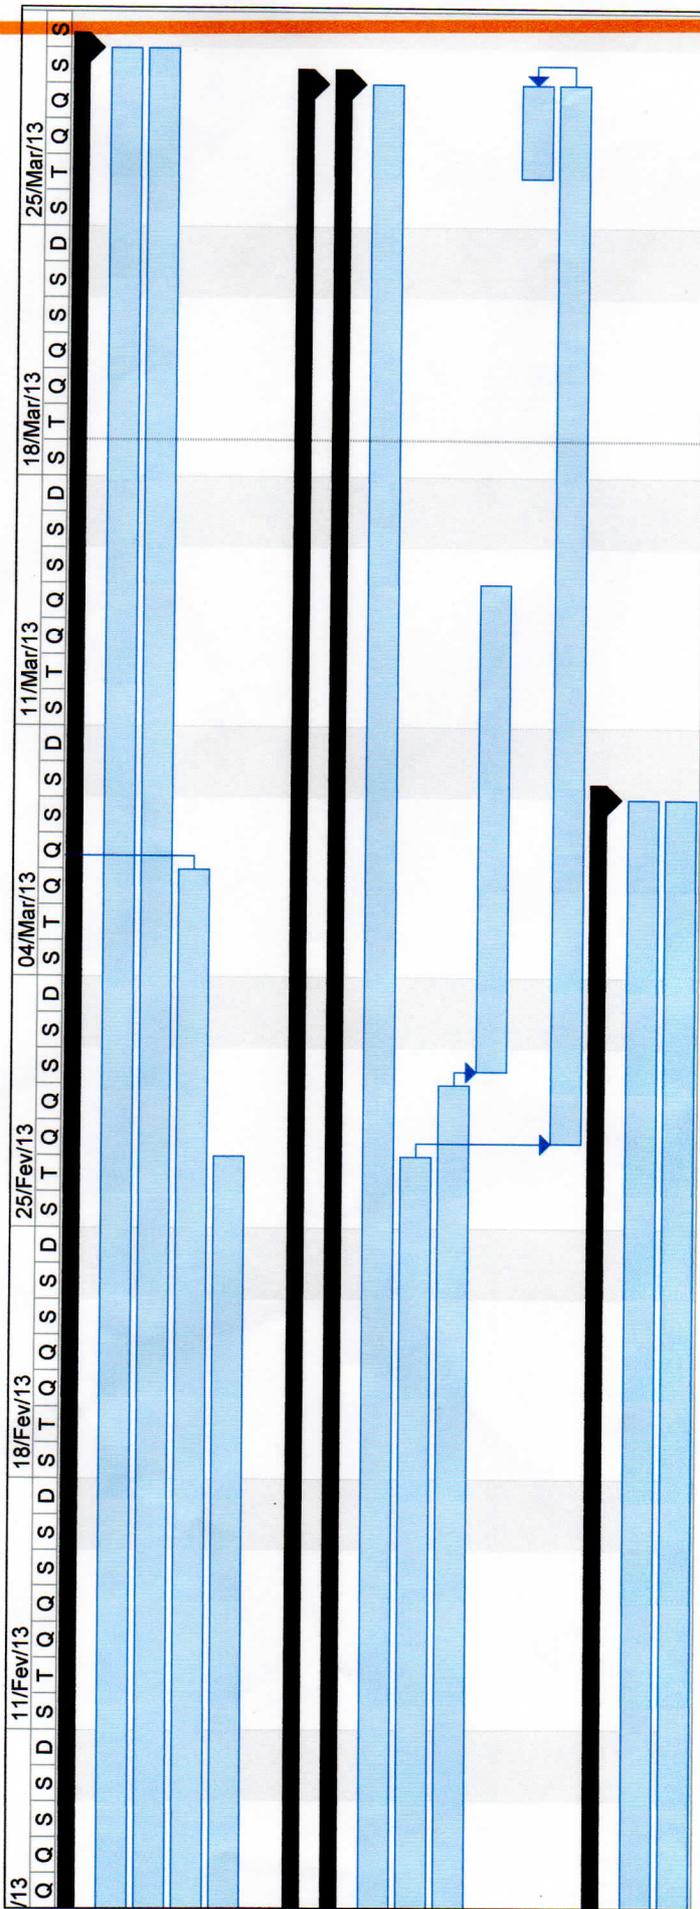

Projeto: TMP.MPP
Data: Ter 19/03/13

Tarefa	Etapa	Tarefas externas
Divisão	Resumo	Etapa externa
Andamento	Resumo do projeto	Prazo final

Gabriella Alcantara
Gabriella Alcantara
 Engenheira Civil
 CREA 27636 - D/PE

Concrepoxi Engenharia Ltda.
Concrepoxi Engenharia Ltda.
 Engº Civil Bruno Moraes Ventura
 CREA: 026169-D/PE

Paulo Roberto Correia Batista
Paulo Roberto Correia Batista
 Diretor de Projetos e Obras
 Mat. 3939-0
 PORTO DO RECIFE S/A
